Pos	Subunternehmer	Leistungsart	Datum
1	Heinrich Görtzen 0177-3211803	Erdarbeiten Fundamente	SOLL IST
2	Uwe Johansen 0171-6804820	Bodenplatte	SOLL IST
3	von Bohlen Bau GmbH 04822-950333	Innenmauerwerk EG	SOLL IST
4	Uwe Johansen 0171-6804820	Stahlbetondecke Treppe	SOLL IST
5	Elektro Goedersch 0171-2884771	Elektro Rohrinstallation EG	SOLL IST
6	von Bohlen Bau GmbH 04822-950333	Innenmauerwerk Ringbalken OG	SOLL IST
7		Giebelgerüst	SOLL IST
8	Zimmerei Michael Timm 04882 - 5021	Dachstuhl mit Lattung Stimbretter	SOLL IST
9	Dachdeckerei Ingo Sellerbeck 04331 44124	Dacheindeckung Dachrinne	SOLL IST
10	MH Bau Wolfgang Hofrath 0160-94802213	Vorblockmauerwerk	SOLL IST
11	MJ Massivhaus	Sohle EG ableiten	SOLL IST
12	Zimmerei Michael Timm 04882 - 5021	Dachuntersichtlage verkleiden	SOLL IST
13	Fa. Krause/ Peter Fischer 01776-20013427	Einbau Fenster Aussentüren	SOLL IST
14	Winther u. Fechner 04621-984965	Heizung Sanitär Rohrinstallation	SOLL IST
15	Zimmerei Michael Timm 01758407507	Trockenbau OG	SOLL IST
16	Elektro Goedersch 0171-2884771	Elektro Rohrinstallation OG	SOLL IST
17	MH Bau Wolfgang Hofrath 0160-94802213	Sohlbänke und Fensterbänke	SOLL IST
18	Alpha Putz 01726877263	Innenputz	SOLL IST
19	Septrikas 0172-3290648	Blower Door Test	SOLL IST
20	Winther u. Fechner 04621-984965	Heizung Installation	SOLL IST
21	Bahnsen 04604-2150	Estrich Hausanschlüsse	SOLL IST
22		Estrichtrocknung	SOLL IST
23	Winther u. Fechner 04621-984965	Solarinstallation Dach	SOLL IST
24	Friedrichsen 0171-3860006	Fliesenarbeiten	SOLL IST
25	Winther u. Fechner 04621-984965	Endmontage Sanitär	SOLL IST
26	Elektro Goedersch 0171-2884771	Endmontage Elektro	SOLL IST
27	J. Jackstadt 0171-3779753	Innentüren	SOLL IST
28	ZTM Zaun-,Tor- und Metallbau Jackstadt & Petersen GmbH	Treppengeländer	SOLL IST
29	MJ Massivjaus	Abnahme und Übergabe	SOLL IST

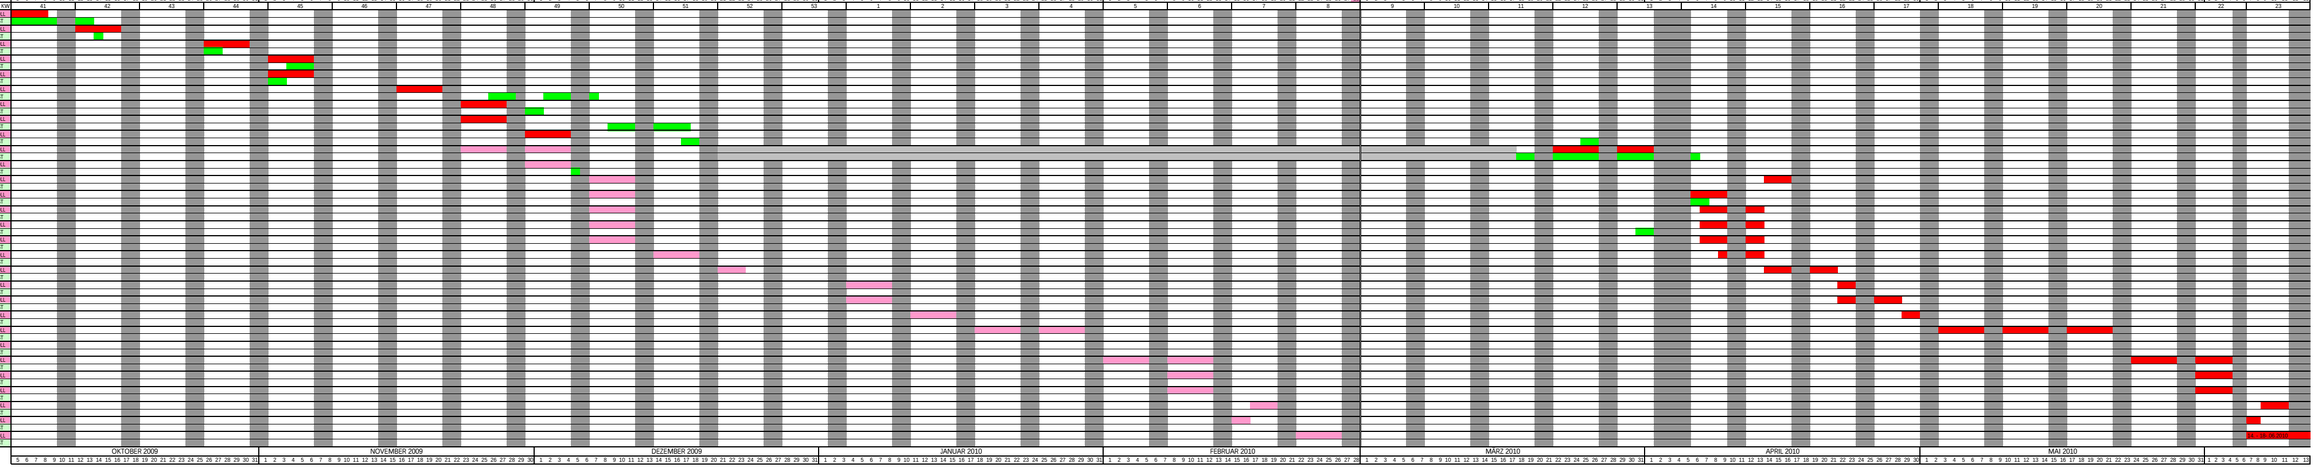

Bauzeitgarantie laut MJ Massivhaus: 4,5 Monate
ab Fertigstellung Bodenplatte
Planung MJ vom 22.02.2009 Fertigstellung 28. Februar 2010
Planung MJ vom 29.03.2010 Fertigstellung 18. Juni 2010
